



Universidade Federal de Pernambuco  
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

## **RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (fevereiro de 2024)**

### **OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE.**

Data de início: 16/01/2023

Prazo de execução: 300 dias corridos

Vigência do contrato: 24/05/2024

Empresa executora: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Número do contrato: 83/2022

Engenheiro Fiscal: Rosenildo Muniz da Silva


Valor da obra: R\$ 1.221.933,45

Valor pago: R\$ 987.178,66


Percentual executado da obra: 80,79%

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas instalações elétricas e na rede de lógica no departamento de Antibióticos e do biotério. Foi executada na parte civil, o reservatório d'água e o filtro anaeróbico. Contudo, a 90% do escopo dos serviços contemplados em planilha licitada é de rede elétrica, lógica e ar condicionado, a saber: Instalação a subestação aérea; troca do QGBT do prédio de Antibióticos, alimentação independente vindo da subestação até o QDC - Biotério; instalação de câmeras e switch nos dois prédios. Instalações de quadros parciais e novos circuitos de ar condicionado, por pavimento, no depto de Antibióticos, entre outros.

**Relatório fotográfico (janeiro/fevereiro 2024)**

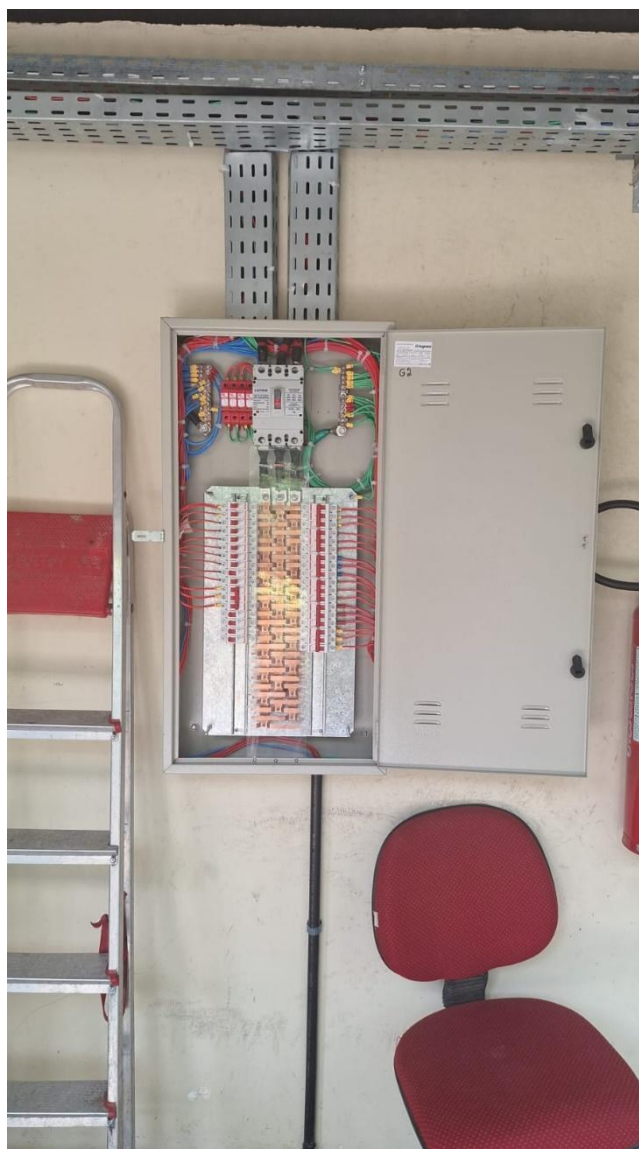


Instalação do QDC - Biotério

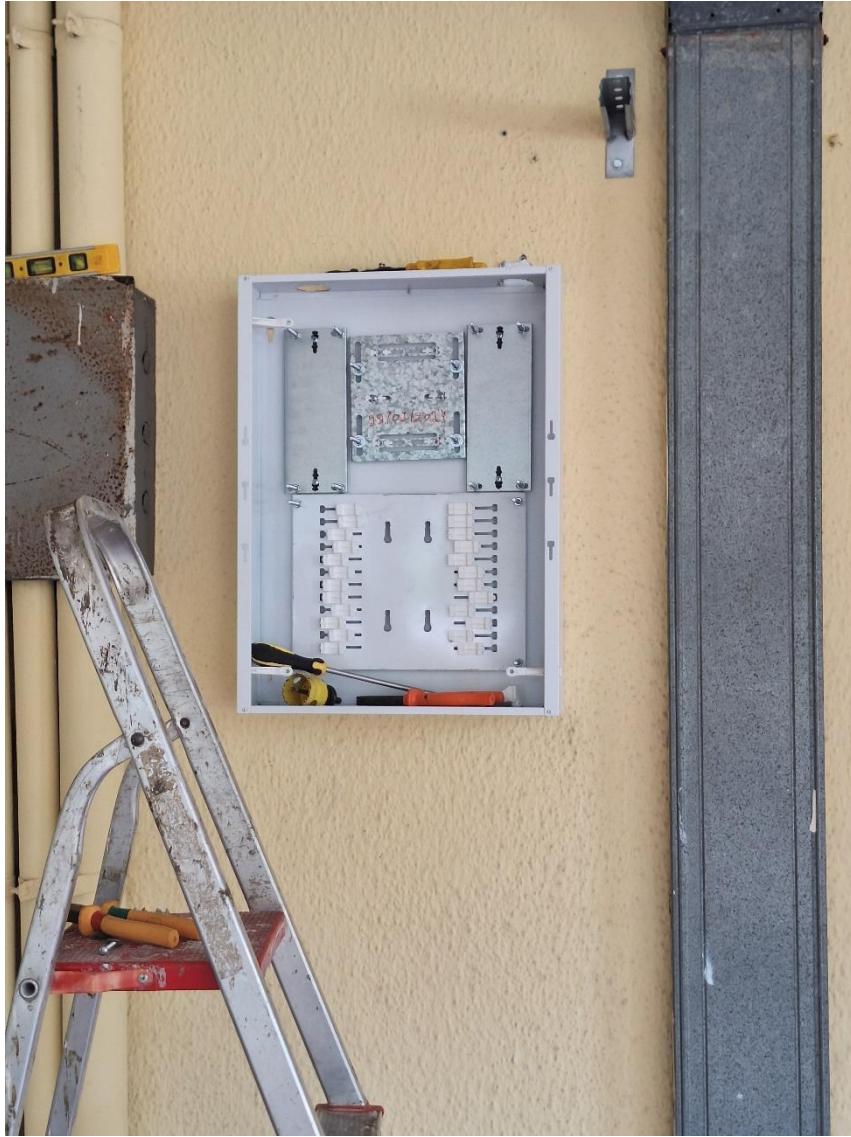

Instalação do QDC sobre loja




Instalação do QDC - 2 andar

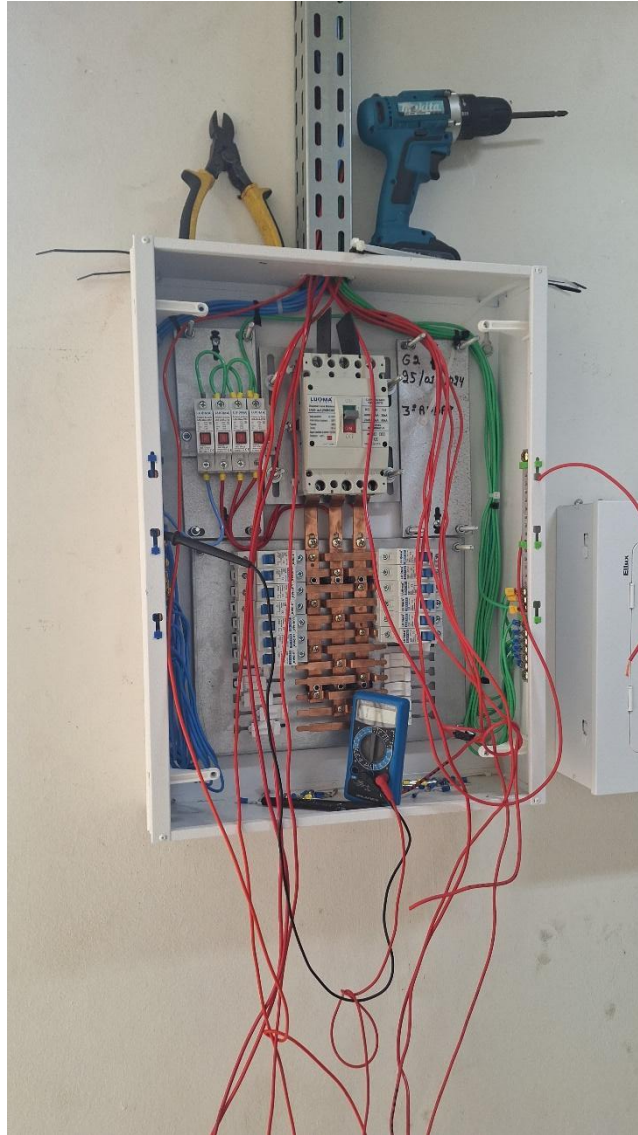

Instalação do QDC - 3º andar




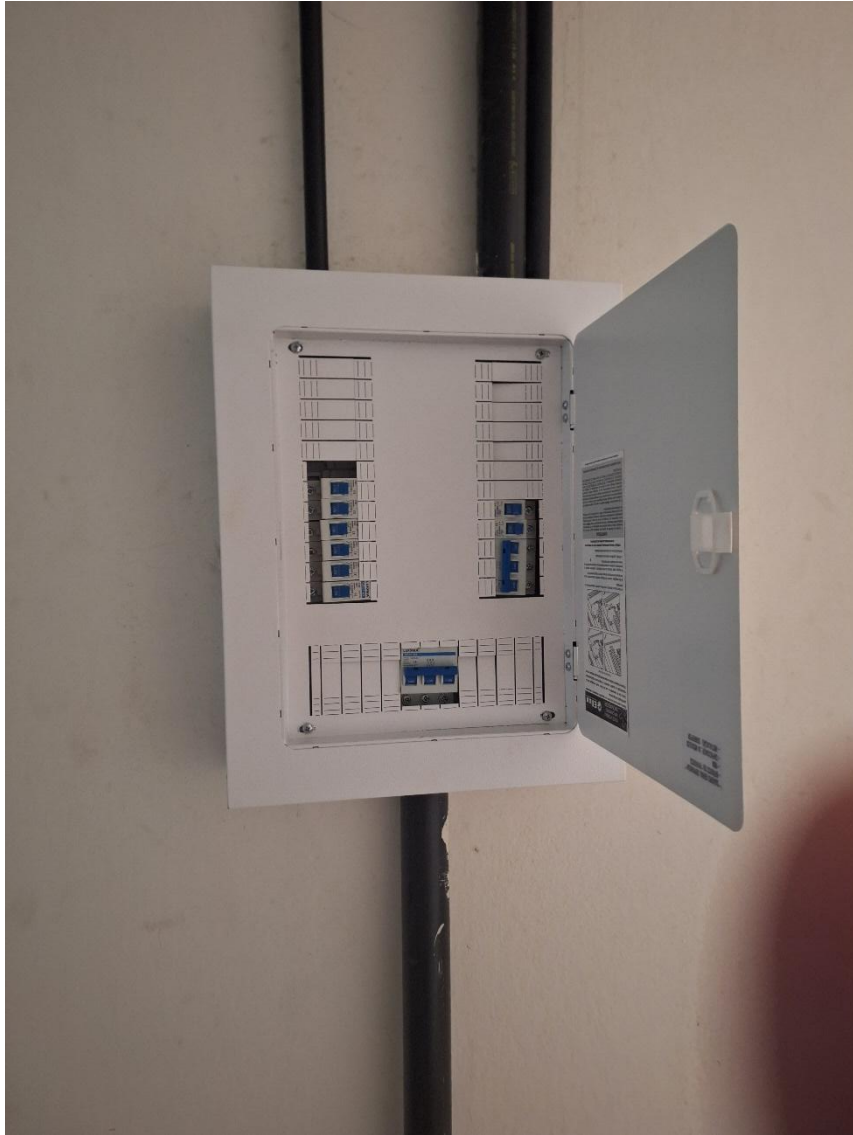

Instalação do QDC - 4º andar



Instalação dos Astop dos ar condicionados e nas outras salas do 4º andar.

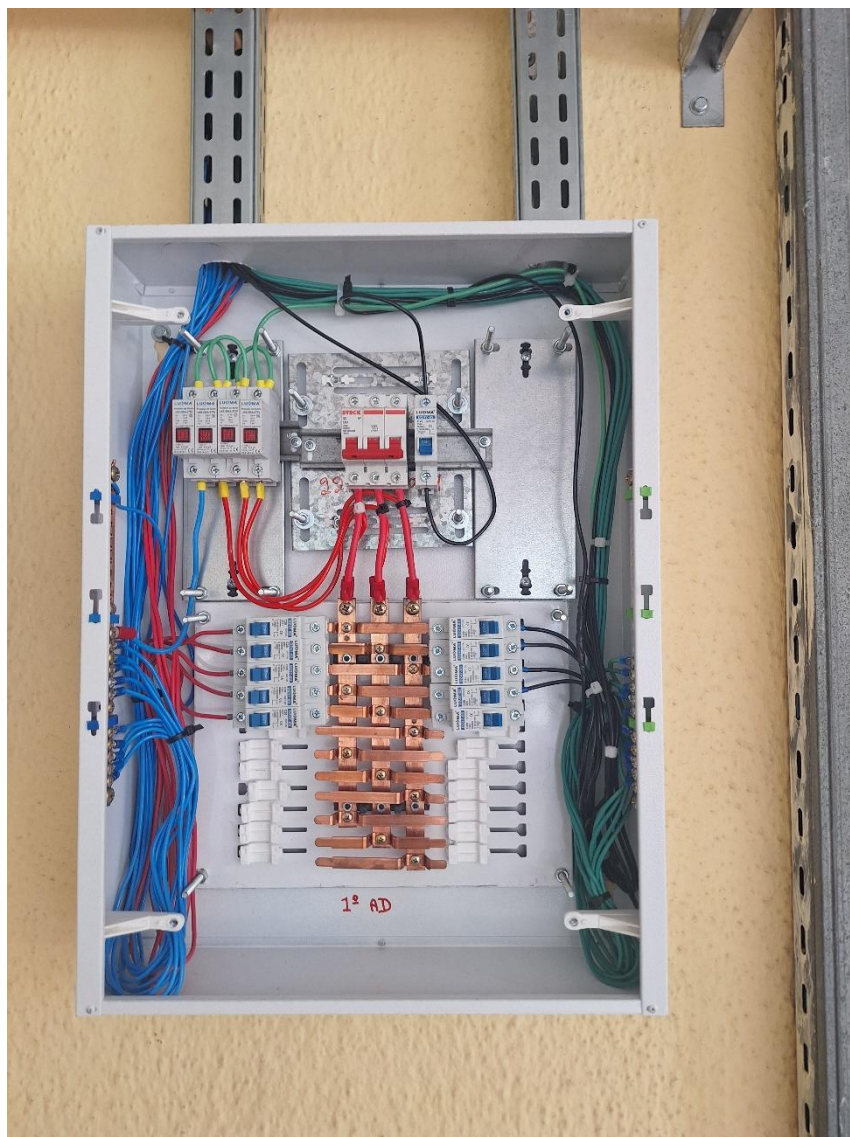

Instalação do QDC - sobre-loja
